Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish	Primary Resource	Total Float
Jerry PLT MP	**Jerry PLT Master plan**	194,0d	09-Jan-06 A	09-Oct-06		1103,0d
Jerry PLT MP.PMS	**Product Milestones - R...**	176,0d	03-Feb-06	09-Oct-06		1103,0d
PLT2910	M0	0,0d		03-Feb-06		1271,0d
PLT2920	S0	0,0d		28-Feb-06		1254,0d
PLT2930	M1	0,0d		14-Mar-06		1244,0d
PLT2940	S15	0,0d		18-Apr-06		1222,0d
PLT2950	S2	0,0d		17-May-06		1202,0d
PLT2960	S25	0,0d		22-Jun-06		1178,0d
PLT2970	S3	0,0d		14-Aug-06		1141,0d
PLT3000	S3 - HW	0,0d		14-Aug-06		1141,0d
PLT3010	AS - Type Approval Start	0,0d		14-Aug-06		1141,0d
PLT3030	PS - Production Start	0,0d		01-Sep-06		1127,0d
PLT2890	DS - Delivery Start	0,0d		15-Sep-06		1117,0d
PLT2980	M3/ S4	0,0d		09-Oct-06		1101,0d
Jerry PLT MP.<Product> PLT-TP	**PLT targ...**	194,0d	09-Jan-...	09-Oct-06		1103,0d
Jerry PLT MP.<Product> PLT-TP.PMS-TP	**Product M...**	176,0d	03-Feb-06	09-Oct-06		38,0d
PLT-TP2190	M0	0,0d		03-Feb-06*		6,0d
PLT-TP2200	S0	0,0d		28-Feb-06*		0,0d
PLT-TP2210	M1	0,0d		14-Mar-06*		0,0d
PLT-TP2220	S15	0,0d		18-Apr-06*		0,0d
PLT-TP2230	S2	0,0d		17-May-06*		0,0d
PLT-TP2240	S25	0,0d		22-Jun-06*		0,0d
PLT-TP2280	S3 - HW	0,0d		14-Aug-06*		0,0d
PLT-TP2290	AS - Type Approval Start	0,0d		14-Aug-06*		0,0d
PLT-TP2250	S3	0,0d		14-Aug-06*		0,0d
PLT-TP2310	PS - Production Start	0,0d		01-Sep-06*		0,0d
PLT-TP2170	DS - Delivery Start	0,0d		15-Sep-06*		5,0d
PLT-TP2260	M3/S4	0,0d		09-Oct-06*		38,0d
Jerry PLT MP.<Product> PLT-TP.Main Board	**HW La...**	191,0d	09-Jan-...	06-Oct-06		1104,0d
PLT-TP2320	B1 Schematic, layout & tape out	23,0d	09-Jan-...	08-Feb-06		0,0d
PLT-TP2330	B1 PCB (not phone) (10d PCB o...	19,0d	09-Feb-06	07-Mar-06		0,0d
PLT-TP2370	B1 PCB evaluation (15d evaluation, 5...	20,0d	08-Mar-06	04-Apr-06		0,0d
PLT-TP2400	B1+ PCB manufacture (10d PCB order, ...	14,0d	05-Apr-06	27-Apr-06		0,0d
PLT3110	B1+ Phone assembly (PCB + Mech)	3,0d	28-Apr-06	02-May-06		0,0d
PLT-TP2380	B1+ evaluation (10d evaluation, 5d revi...	25,0d	03-May-...	09-Jun-06		9,0d
PLT3130	B2 PCB manufacture (10d PCB order, 4d...	14,0d	12-Jun-06	29-Jun-06		9,0d
PLT3120	B2 Phone assembly (PCB + Mech)	3,0d	13-Jul-06	17-Jul-06		0,0d
PLT-TP2390	B2 phone evaluation	14,0d	18-Jul-06	04-Aug-06		0,0d
PLT-TP2070	Pilot run (?k)	15,0d	14-Aug-06	01-Sep-06		0,0d
PLT-TP2080	Ramp up DS quantity (?k)	10,0d	04-Sep-06	15-Sep-06		5,0d
PLT-TP2060	Ramp up M3/S3 quantity	15,0d	18-Sep-06	06-Oct-06		1102,0d
Jerry PLT MP.<Product> PLT-TP.MD	**Mechanics**	171,0d	11-Jan-...	06-Sep-06		1126,0d
PLT-TP2570	Start mechanical design	0,0d	11-Jan-...			
PLT-TP2580	Verify Penelope stackup	25,0d	11-Jan-...	27-Jan-06		0,0d
PLT3140	Finalize industrial design & supplier selection	22,0d	30-Jan-06	28-Feb-06		0,0d
PLT-TP2530	Realize mechanical design (50% CAD data)	10,0d	01-Mar-06	14-Mar-06		0,0d
PLT-TP2560	Realize mechanical design (80% CAD data)	10,0d	15-Mar-06	28-Mar-06		0,0d
PLT-TP3040	Realize mechanical design for SLA parts	10,0d	15-Mar-06	28-Mar-06		1229,0d
PLT-TP2540	SLA parts (A1->B1)	5,0d	29-Mar-06	04-Apr-06		1229,0d
PLT-TP2620	Mechanical design (100% CAD data)	5,0d	29-Mar-06	04-Apr-06		0,0d
PLT3060	Soft tool B1 sampling	20,0d	29-Mar-06	25-Apr-06		0,0d
PLT3100	TTDs for S15	10,0d	05-Apr-06	18-Apr-06		0,0d
PLT-TP2590	SOT Hard tool 1st cav Parts (B1+)	30,0d	18-Apr-06	31-May-06		0,0d
PLT3050	Test B1 samples + new 3D	15,0d	26-Apr-06	16-May-06		0,0d
PLT3070	Test B1+ samples + new 3D	15,0d	01-Jun-06	21-Jun-06		0,0d
PLT-TP2600	FOT Hardtool parts (RU)	40,0d	22-Jun-06	16-Aug-06		1124,0d
PLT-TP2610	TOT Hardtool (1st cav) parts (B2)	15,0d	22-Jun-06	12-Jul-06		0,0d
PLT3080	Yeild optimisation	15,0d	17-Jul-06	04-Aug-06		0,0d
PLT3090	B2 delta test	15,0d	17-Jul-06	04-Aug-06		0,0d
PLT-TP2630	Pilot Run Parts	5,0d	07-Aug-06	11-Aug-06		0,0d
PLT3040	SOT Hardtool parts (RU)	15,0d	17-Aug-06	06-Sep-06		1124,0d
Jerry PLT MP.<Product> PLT-TP.SW	**SW**	138,0d	22-Feb-06	04-Sep-06		53,0d
PLT-TP2690	B1 SW delivery	0,0d		22-Feb-06		0,0d
PLT-TP2730	B1+ SW delivery	0,0d		21-Apr-06		0,0d
PLT-TP2720	S2 SW delivery	0,0d		02-May-06		0,0d
PLT-TP2700	S25 SW delivery	0,0d		31-May-06		0,0d
PLT-TP2740	TA SW delivery	0,0d		22-Jun-06		6,0d
PLT-TP2760	S3 SW delivery	0,0d		22-Jun-06		6,0d
PLT-TP2770	DS SW delivery	0,0d		04-Sep-06		14,0d
PLT-TP2750	M3/S4 SW delivery	0,0d		04-Sep-06		53,0d
Jerry PLT MP.<Product> PLT-TP.ST	**System Test**	114,0d	03-May-...	09-Oct-06		38,0d
Jerry PLT MP.<Product> PLT-TP.ST.MstTests	**Milesto...**	99,0d	03-May-...	18-Sep-06		53,0d
PLT-TP2490	S2 tests -> S2	10,0d	03-May-...	17-May-06		0,0d
PLT-TP2470	S25 tests -> S25	15,0d	01-Jun-06	22-Jun-06		0,0d
PLT-TP3060	AS test -> AS Type Approval Start	15,0d	23-Jun-06	13-Jul-06		6,0d
PLT-TP2520	S3 tests -> S3	20,0d	18-Jul-06	14-Aug-06		0,0d
PLT-TP2500	DS tests -> DS	15,0d	15-Aug-06	04-Sep-06		14,0d
PLT-TP2510	M3/S4 tests -> M3/S4	10,0d	05-Sep-06	18-Sep-06		53,0d
Jerry PLT MP.<Product> PLT-TP.ST.TA	**Type Approval**	77,0d	23-Jun-06	09-Oct-06		38,0d
PLT-TP2430	SW test before TA	25,0d	23-Jun-06	27-Jul-06		12,0d
PLT-TP2420	FTA (Europe)	45,0d	14-Jul-06	14-Sep-06		6,0d
PLT-TP2440	FCC (US) Early Grant	20,0d	15-Aug-06	11-Sep-06		9,0d
PLT3150	Delta HW FTA (Europe)	10,0d	15-Aug-06	28-Aug-06		19,0d
PLT-TP2450	FCC (US) Grace Period	20,0d	12-Sep-06	09-Oct-06		38,0d
Jerry PLT MP.<Product> PLT-TP.QM	**Quality Manag...**	97,0d	03-May-...	14-Sep-06		55,0d
PLT-TP2130	B1 Long term tests	30,0d	03-May-...	16-Jun-06		4,0d
PLT-TP2160	B1 Short term tests	10,0d	03-May-...	17-May-06		0,0d
PLT-TP2090	B1+ Long term tests	30,0d	01-Jun-06	13-Jul-06		22,0d
PLT-TP2110	B1+ Short term tests	15,0d	01-Jun-06	22-Jun-06		0,0d
PLT-TP2150	CAT Customer Acceptance Test (VF 12W)	60,0d	23-Jun-06	14-Sep-06		6,0d
PLT-TP2100	B2 Long term tests (SOT)	30,0d	18-Jul-06	28-Aug-06		68,0d
PLT-TP2120	B2 Short term tests	20,0d	18-Jul-06	14-Aug-06		0,0d
PLT-TP2140	GCF field test	15,0d	28-Jul-06	17-Aug-06		26,0d

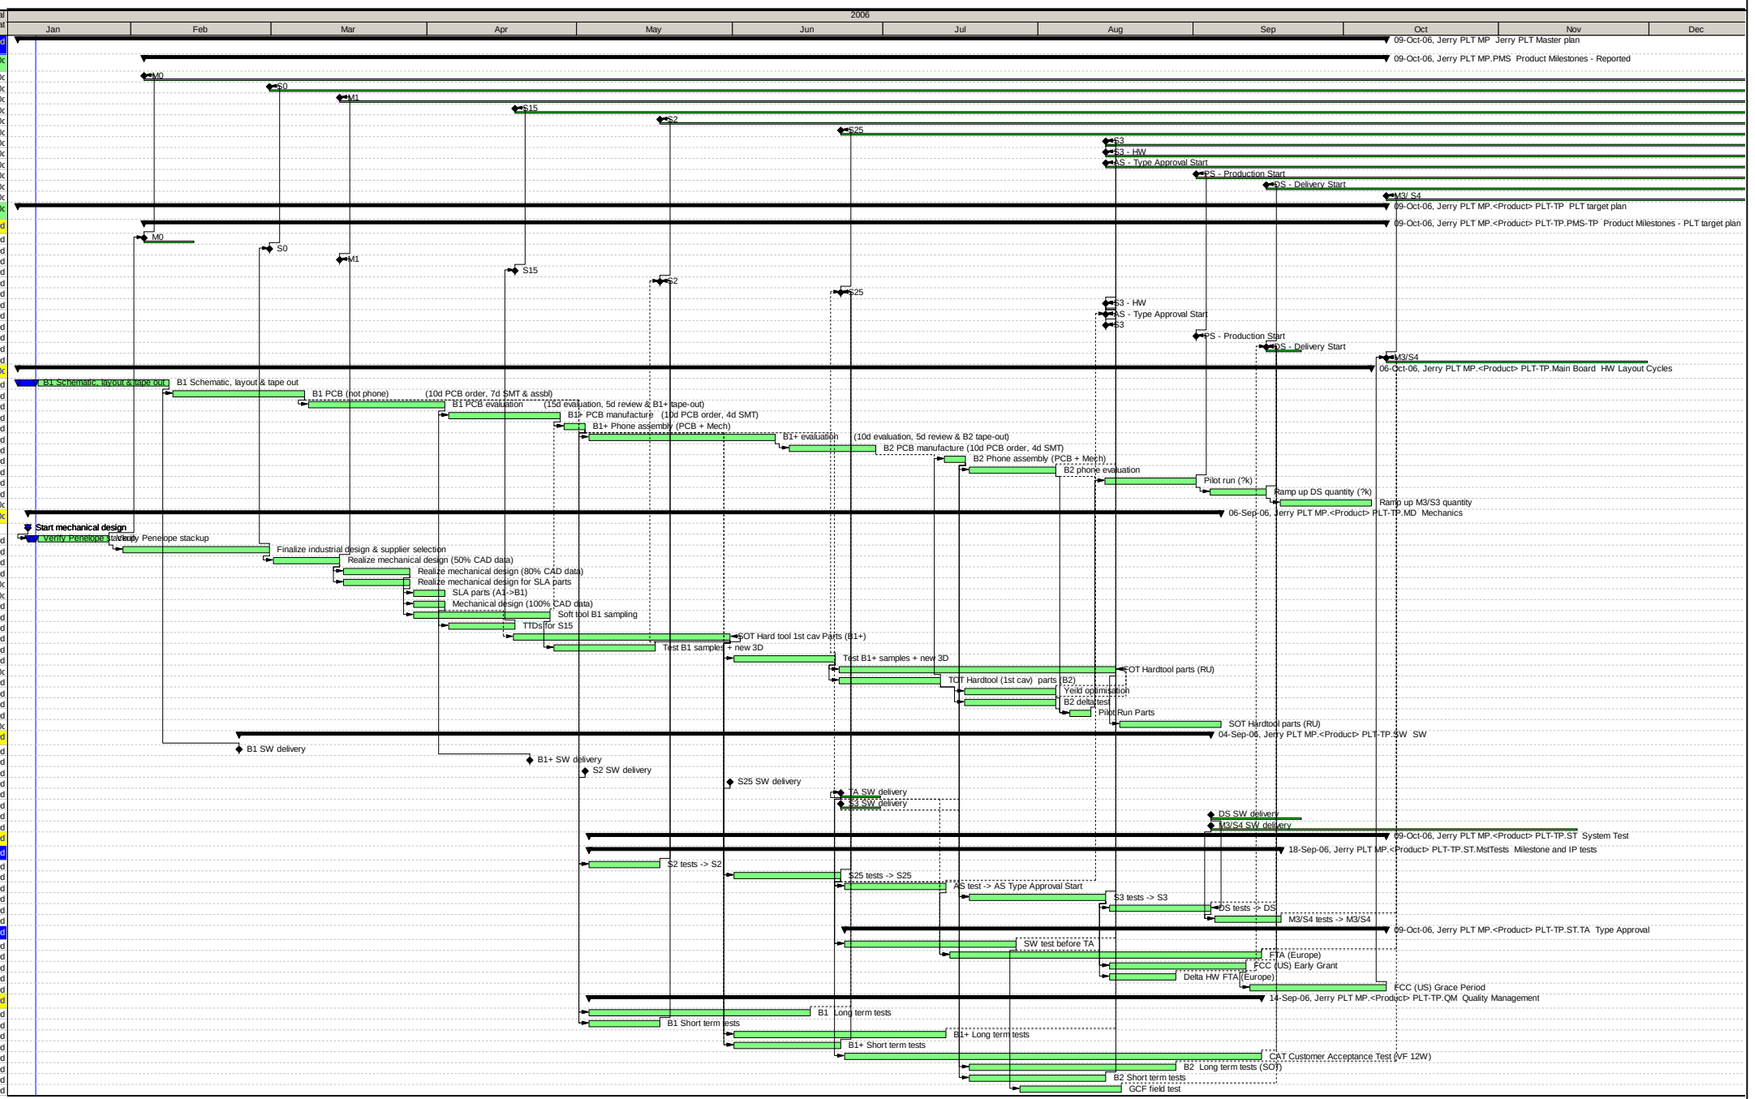

© Primavera Systems, Inc.
